

MEDAPPOINT

Пламена Стоянова 3MI0600019

Божидар Горанов 0MI0600022

Мария Иванова 9MI0600045

Николай Костандиев 6MI0600046

Виктор Христов 1MI0600098

Описание на проекта и програма за реализация

Съдържание

1. Състояние в съответното тематично направление.....	2
2. Описание на работната програма по проекта.....	5
2.1. Общо описание:.....	5
2.2. Работна програма и Задачи.....	6
2.3. Разпределение на ресурсите на проекта по задачи.....	13
3. План за разпространение на резултатите (Комуникационна стратегия).....	15
4. Управление на проекта.....	17
5. Описание на проектния екип и съответното звено – бенефициент.....	21

1. Състояние в съответното тематично направление

■ Кратко описание на състоянието в областта

Проектът се фокусира върху оптимизацията на процеса за достъп до медицински грижи, елиминирайки нуждата пациентите да чакат дълго за посещение при специалист. Предложеното решение представлява платформа за онлайн резервации, която позволява на пациентите да запазват час при подходящ медицински специалист и включва опция за качване и съхраняване на медицински документи като изследвания и резултати от прегледи. Това улеснява пациентите при посещението им, тъй като им позволява да съхраняват цялата си медицинска документация на едно място и да я споделят с лекарите, когато е необходимо, без да се налага да я носят на хартия. Освен резервации, системата предлага предварителна онлайн консултация, за да помогне на пациентите да изберат правилния специалист, ако не са сигурни какъв тип медицинска помощ им е необходима. Платформата също така включва функции за оставяне на отзиви и оценка за специалистите и медицинските заведения, които потребителите могат да използват преди да направят своя избор. Допълнителна функционалност е интегрираният 24-часов съпорт чат, който осигурява помощ при въпроси и проблеми с използването на системата.

■ Необходимост от проектните дейности

Основният проблем, който проектът се опитва да разреши, е неефективността и загубата на време, свързани с посещенията при лекари, както и необходимостта от пренасяне на медицински документи. Проектът е нужен както на национално, така и на европейско ниво, тъй като подобни проблеми са често срещани в здравеопазването. Системата не само решава проблема с чакането, но и предоставя на пациентите контрол върху медицинските им данни и лесен достъп до специалисти. Това е особено важно в контекста на дигитализацията на здравеопазването.

■ Описание на клиентите/целевата група

Външни заинтересовани лица:

■ Застрахователни компании:

Те могат да използват системата, за да предлагат на клиентите си възможност за лесно резервиране на прегледи и управление на техните здравни застраховки чрез същата платформа.

■ Доставчици на медицински софтуер:

Фирми, които могат да интегрират своите продукти със системата, предоставяйки допълнителни услуги като управление на медицински досиета и анализ на здравни данни.

■ Държавни институции:

Регулаторни органи и здравни министерства, които ще имат интерес от внедряването на такава система за повишаване на ефективността на здравеопазването и по-добър контрол върху качеството на предоставяните услуги.

■ Обществени здравни организации:

Те ще се възползват от подобряването на достъпа до здравни грижи и оптимизирането на процесите в медицинските заведения, както и от по-доброто управление на здравната информация на населението.

- **Частни здравни клиники:**

Те могат да използват системата като част от своите услуги, за да предоставят по-добро обслужване на клиентите си и да улеснят процесите по записване на прегледи и съхранение на медицинска информация.

- **Пациенти:**

Крайни потребители на системата, които ще запазват часове за прегледи и ще съхраняват своите медицински документи онлайн. Те ще се възползват от по-бърз достъп до здравни услуги и удобство при управлението на своята медицинска информация.

- **Лекари:**

Те ще използват системата за организиране на графика и по-лесен достъп до медицинската информация на пациентите. Това ще подобри ефективността им при работа и ще намали времето за подготовка за прегледи.

- **Медицински заведения:**

Те ще използват системата за подобряване на административните процеси, улесняване на координацията между лекари и пациенти, както и за привличане на повече пациенти.

Вътрешни заинтересовани лица:

- **Проектен мениджър:**

Проектният мениджър ще координира цялостното изпълнение на проекта, като планира и управлява задачите, екипа и времевите графици. Той ще бъде отговорен за управлението на рисковете, качеството на изпълнение и комуникацията с всички заинтересовани страни, както вътрешни, така и външни. Проектният мениджър ще осигурява съгласуваност между различните отдели (разработка, финанси, юридически) и ще следи за спазването на целите и сроковете на проекта.

- **Продуктов мениджър:**

Продуктовият мениджър ще бъде отговорен за визията, стратегията и развитието на платформата за записване на медицински прегледи. Той ще работи в тясно сътрудничество с техническите екипи, маркетинговия отдел и експертите по здравеопазване, за да гарантира, че продуктът отговаря на нуждите на потребителите и целевия пазар.

- **Финансов мениджър:**

Финансовият мениджър ще играе ключова роля в управлението на финансовите ресурси, свързани с проекта. Той ще отговаря за бюджета, планирането на разходите и контролирането на приходите, осигурявайки, че проектът е финансово устойчив. Също така ще следи за паричните потоци, ще анализира разходите и ще подготвя отчети за инвестициите и финансовото състояние на проекта. Финансовият мениджър ще бъде отговорен и за комуникацията с външни финансиращи институции, ако е необходимо.

- **Юрист:**

Юристът ще играе съществена роля в осигуряването на правна съвместимост на системата. Той ще следи за спазването на законите за защита на личните данни (GDPR или други местни закони), ще изготвя и преглежда договори със

съдружници и клиенти, както и ще гарантира, че системата отговаря на всички регулаторни изисквания. Юристът ще отговаря и за правните аспекти при интеграция с други платформи, защита на интелектуална собственост и евентуални правни спорове.

- **Експерти по здравеопазването:**

Експертите по здравеопазването ще предоставят професионални знания и съвети, свързани със спецификата на медицинските услуги и потребностите на пациентите. Те ще осигурят, че системата е съобразена с нуждите на медицинските специалисти и пациенти, както и че съдържанието и функционалностите са в съответствие със стандартите и етичните норми в здравеопазването.

- **Специалисти по пазарни и конкуренти проучвания:**

Тези специалисти ще извършват анализ на пазара и конкурентите, за да осигурят, че проектът отговаря на нуждите на целевата аудитория и се откроява сред конкурентите. Те ще събират и анализират данни за тенденции, потребителски предпочитания и нововъведения в индустрията. Ролята им включва и предоставяне на препоръки за подобрения на продукта, стратегии за позициониране и ценови модели.

- **Фирма за разплащания:**

Вътрешната роля на фирмата за разплащания е да осигури безопасни и ефективни финансови трансакции в системата. Тя ще бъде отговорна за интеграцията на платежни решения, които позволяват на потребителите да извършват плащания за медицински услуги онлайн. Фирмата ще трябва да гарантира високо ниво на сигурност при обработването на чувствителни данни (напр. банкови карти), да осигури поддръжка на различни методи за разплащане (кредитни карти, PayPal и др.) и да гарантира, че всички трансакции са съобразени със законодателството за онлайн разплащания и финансови услуги.

- **Технически екипи:**

Програмисти и разработчици, които ще отговарят за създаването, актуализирането и поддръжката на системата, както и за интегрирането на нови функционалности.

- **Екип по маркетинг:**

Екипът по маркетинг ще отговаря за популяризирането на платформата, за да достигне до максимален брой потребители. Те ще разработват и изпълняват маркетингови кампании, включително дигитална реклама, социални мрежи, имейл маркетинг и събития. Екипът ще се фокусира върху изграждането на доверие сред пациентите и медицинските специалисти, както и върху създаването на бранд идентичност, която подчертава надеждността и иновациите на системата.

2. Описание на работната програма по проекта

2.1. Общо описание:

- **Общо описание**

Проектът има за цел да оптимизира и улесни достъпа на пациентите до медицинска помощ чрез внедряване на платформа за онлайн резервации на прегледи при медицински специалисти. Основната задача е да се намали времето за изчакване и да се осигури бърз и удобен достъп до медицинска помощ, както и лесно съхранение и споделяне на медицински документи между пациентите и специалистите. Проектът включва функции за предварителна консултация, оценка и коментари за специалистите, 24-часова поддръжка и възможност за сигурно качване на медицински документи.

- **Основна цел**

Основната цел на проекта е създаването на цялостна система за онлайн резервации и управление на медицински посещения, което да улесни и подобри процеса на взаимодействие между пациенти и медицински специалисти. Крайният резултат е готова за използване платформа, която да служи като услуга за пациенти и медицински специалисти, улеснявайки комуникацията, намалявайки времето за чакане и оптимизирайки съхранението и управлението на медицински документи.

- **Подцели (цели на работни пакети)**

- Проучване на състоянието, определяне на основните тенденции и проблеми при други системи, свързани със здравеопазването. Формулиране на крайните изисквания.
- Имплементиране и валидиране на системата.
- Разпространяване на системата/приложението чрез реклама и сключване на договори със съдружници
- Качествено и в срок изпълнение на проекта

- **Продължителност на проекта и основни етапи**

Проектът се предвижда да бъде с продължителност от 12 месеца, като се състои от следните основни етапи:

- Анализ на средата и определяне на изискванията (1-4 месец)
- Разработване на системата (4-10 месец)
- Маркетинг (10-12 месец)
- Управление на проекта (1-12 месеца)

2.2. Работна програма и Задачи

- Обща структура на работната програма (Таблица 1)

Таблица 1. Работни пакети

номер на работен пакет	име на работен пакет	цел на работен пакет
РП 1	Анализ на средата и определяне на изискванията	Проучване на състоянието, определяне на основните тенденции и проблеми при други системи, свързани със здравеопазването. Формулиране на крайните изисквания.
РП 2	Разработване на системата	Имплементиране и валидиране на функционалностите.
РП 3	Маркетинг	Разпространяване на приложението чрез реклама и сключване на договори със съдружници
РП 4	Управление на проекта	Качествено и в срок приключване на проекта

- Обща методология на работната програма
Работната програма на проекта MedAppoint се състои от четири работни пакета. Методологията на работната програма следва структуриран подход, като работата е съставена от етапи и задачи, разпределени според приоритети и взаимозависимости. Всяка задача се възлага на членове на екипа в съответствие с техните компетенции, което осигурява ефективност и високо качество на изпълнението. Контролът и мониторингът позволяват навременни корекции при нужда, като така се гарантира постигането на целта в рамките на планираните срокове и ресурси.
- Описание на работните пакети (Таблица 2 за всеки отделен пакет)

Таблица 2.1. Описание на работен пакет 1

номер и име на работен пакет: РП 1: Анализ на средата и определяне на изискванията	
начало (месец): 0	край (месец): 4
цел: Проучване на състоянието, определяне на основните тенденции и проблеми при други системи, свързани със здравеопазването. Формулиране на крайните изисквания.	
основни задачи: 1.1. Проучване на конкурентните решения Екип от специалисти в областта на пазарните проучвания ще направят анализ на текущото съотношение между търсене и предлагане на подобен тип решения в сферата на медицината. Ще се изготви проучване за това какъв тип хора биха използвали подобна система, като ще бъдат разделени по възрастови групи и пол. Ще бъдат проучени конкурентни платформи за записване на часове при медицински специалисти, за да се разберат актуалните тенденции, добри практики и често срещани проблеми. Чрез	

събраната информация ще определим, какъв тип потребители трябва да бъдат таргетиран и по какъв начин можем да подобрим вече съществуващи конкурентни системи.

1.2. Определяне на правните аспекти и нормативните документи

Ще се извърши задълбочено проучване на изискванията за съхранение, обработка и споделяне на лична и здравна информация. Тази задача включва консултации с юридически експерти и анализ на документи, касаещи здравната и технологичната индустрия. Целта е да се гарантира, че системата ще отговаря на всички необходими регулации и стандарти за сигурност и защита на данните.

1.3. Провеждане на срещи със заинтересовани лица и публикуване на анкети

Ще се организират индивидуални и групови срещи със заинтересованите лица, за да се обсъдят техните нужди и очаквания от приложението, както и евентуалният им опит и впечатления от други конкурентни системи. Ще се подготвят въпросници и теми за обсъждане, целящи идентифициране на ключовите функционалности, възможни проблеми и необходимите интеграции. Ще се състави анкета с въпроси, достигаща до по-широк кръг хора, целящи разбиране на предпочитанията и очакванията на потенциалните потребители на приложението. Анкетата ще бъде публикувана онлайн и ще бъде насочена както към пациенти, така и към медицински специалисти. Данните от срещите ще послужат за съставяне на първоначален списък с изисквания и спецификации. Докато данните от анкетите ще бъдат анализирани и обобщени, за да се направи по-точна оценка на основните потребителски изисквания.

1.4. Изготвяне на техническа спецификация

На база на събраните данни и анализи от предходните задачи, ще се състави техническа документация, която описва подробно всички основни функционалности. Спецификацията ще включва и нефункционални изисквания като производителност, сигурност, съвместимост и други релевантни за такъв тип система.

резултати (deliverables):

1.1. Доклад описващ текущото състояние на пазара

Списък със заинтересовани лица

Списък с основните конкуренти и откритите пропуски в техните решения

Общ период - 0 - 1 месец

1.2. Документ, описващ правните ограничения и норми - Период: 0 - 1 месец

1.3. Първоначален списък с изисквания спрямо нуждите на заинтересованите лица -

Период: 1 - 3 месец

1.4. Документ, съдържащ функционални и нефункционални изисквания -

Период: 3 - 4 месец

Таблица 2.2. Описание на работен пакет 2

номер и име на работен пакет: РП 2: Разработване на системата	
начало (месец): 4	край (месец): 10
цел: Имплементиране и валидиране на функционалностите	
основни задачи: 2.1. Проектиране на софтуерната архитектура Софтуерни архитекти, ще се погрижат за проектирането на архитектурата на системата. На база на техническата спецификация ще се определят отделните модули на системата и интеграцията между тях, удовлетворявайки нефункционалните изисквания, определени в РП1. 2.2. Дизайн на потребителския интерфейс Въз основа на събраните потребителски изисквания, специалисти в графичния дизайн ще се погрижат да направят прототипен интерфейс, обхващащ всички основни екрани и функционални елементи. В процеса ще се включат и UX експерти, които ще следят за спазването на добрите практики и принципи, за да се създаде визуално привлекателно и функционално преживяване. 2.3. Имплементация и тестване Екип от софтуерни инженери ще разработят системата на базата на спецификацията на функционалните изисквания от задача 1.5 и архитектурата на системата от задача 2.1. Тяхната работа ще включва разработването на отделните backend компоненти, интегрирането им помежду си, както и създаването на потребителския интерфейс, определен в задача 2.2. Разработчиците ще се погрижат и за валидирането на коректността на системата, чрез различни видове тестване (unit, end-to-end и други)	
резултати (deliverables): 2.1. Документ, описващ софтуерната архитектура - <u>Период: 4 - 6 месеци</u> 2.2. Прототипен интерфейс - <u>Период: 5 - 7 месеци</u> 2.3. Валидирано софтуерно решение - <u>Период: 6 - 10 месеци</u>	

Таблица 2.3. Описание на работен пакет 3


номер и име на работен пакет: РП 3: Маркетинг	
начало (месец): 10	край (месец): 12
цел: Разпространяване на приложението чрез реклама и сключване на договори със съдружници.	
основни задачи: 3.1. Изготвяне на рекламни постове и разпространението им в социалните мрежи Ще се създадат атрактивни и ангажиращи публикации за социалните мрежи (Facebook, Instagram и др.), които да информират потребителите за функционалностите на приложението и ползите от него. Тези постове ще включват текст, изображения и кратки видеоклипове, насочени както към пациенти, така и към медицински специалисти. Активното разпространение ще включва таргетирани реклами, публикуване в тематични групи и взаимодействие с аудиторията чрез отговори на въпроси и съобщения. 3.2. Изготвяне на рекламни постери и билборд реклами Ще бъдат проектирани и отпечатани рекламни постери, които да се разпространяват на места с висока посещаемост – медицински заведения, аптеки, обществени центрове. Освен това ще се разработят дизайни за билбордове, разположени на стратегически локации, като големи кръстовища или в близост до болници. Рекламните материали ще подчертават предимствата на приложението, пред други конкурентни такива. 3.3. Срещи с медицински заведения и съдружници Ще бъдат организирани индивидуални и групови срещи с представители на болници, клиники, медицински центрове и индивидуални специалисти. На тези срещи ще бъде представена платформата, нейните функционалности и ползите от нея. Ще бъдат обсъдени възможности за интеграция и сътрудничество, както и съвместни маркетингови инициативи.	
резултати (deliverables): 3.1. Рекламни постове в социални мрежи - <u>Период: 10 - 12 месец</u> 3.2. Рекламни постери и билборд реклами - <u>Период: 10 - 12 месец</u> 3.3. Условия и договори с потенциални съдружници - <u>Период: 10 - 12 месец</u>	

Таблица 2.4. Описание на работен пакет 4

номер и име на работен пакет: РП 4: Управление на проект	
начало (месец): 1	край (месец): 12
цел: Качествено и в срок приключване на проекта	
основни задачи: 4.1. Управление на работа и време - Дефиниране обхват на проекта. Разпределение на работата по екипи и време и определяне на списък с контролните точки Включва се определяне на целите на проекта, основните му компоненти и ограниченията. Ще бъдат идентифицирани конкретните дейности, които трябва да бъдат извършени, очакваните резултати, както и в какъв времеви диапазон ще се случат те. Това ще помогне за избягване на "разрастване на обхвата" на проекта и ще гарантира, че всички заинтересовани страни са наясно с границите и целите на проекта. от друга страна включва идентифициране на екипите и индивидуалните роли, които ще бъдат необходими за изпълнение на задачите по проекта. Ще се изготви план с ясно разпределение на отговорностите, график за изпълнение и контролни точки, които ще служат за проследяване на напредъка. Това ще помогне за координация между екипите и ще осигури, че всеки етап от проекта се завършва навреме. 4.2. Управление на качеството - Следене за изпълнение на възложените задачи в срок и организиране на работни срещи Включва редовно следене на напредъка по възложените задачи чрез планирани проверки и обратна връзка от екипа. Ще бъдат организирани регулярни работни срещи, където ще се обсъжда текущото състояние на проекта, предизвикателствата и необходимостта от промени. 4.3. Управление на финансите Ще бъде изготвен детайлен финансов план, който включва разходи за човешки ресурс, технологии, маркетинг и непредвидени разходи. Редовно ще се следи изпълнението на бюджета чрез сравняване на действителните разходи с предварителните прогнози. При необходимост ще се организират срещи, в които ще се обсъждат евентуални несъответствия и ще се предприемат действия. 4.4. Управление на знанията и риска Включва систематично събиране, документиране и споделяне на информация и добри практики, натрупани по време на проекта. Това ще помогне за по-доброто изпълнение на задачите. Управлението на риска ще включва идентифициране на възможните проблеми, оценка на тяхното въздействие и разработване на стратегии за предотвратяване или минимизиране на тяхното влияние.	
резултати (deliverables): 4.1. Гант диаграма за разпределение на работата във времето Документ, описващ разпределението на човешки ресурси - <u>Период: 0 - 2 месеца</u> 4.2. Анализ на прогреса по зададените задачи - <u>Период: 2 - 12 месеца</u> 4.3. Доклади и статистики за финансите - <u>Период: 2 - 12 месеца</u> 4.4. Документ, описващ потенциалните рискове	

Протокол за запазване на интегритета на проекта при загуба на ключов екипен член и обучение на заместник - Период: 2 - 12 месеца

- Разпределение във времето на задачите на проекта (Gantt chart)

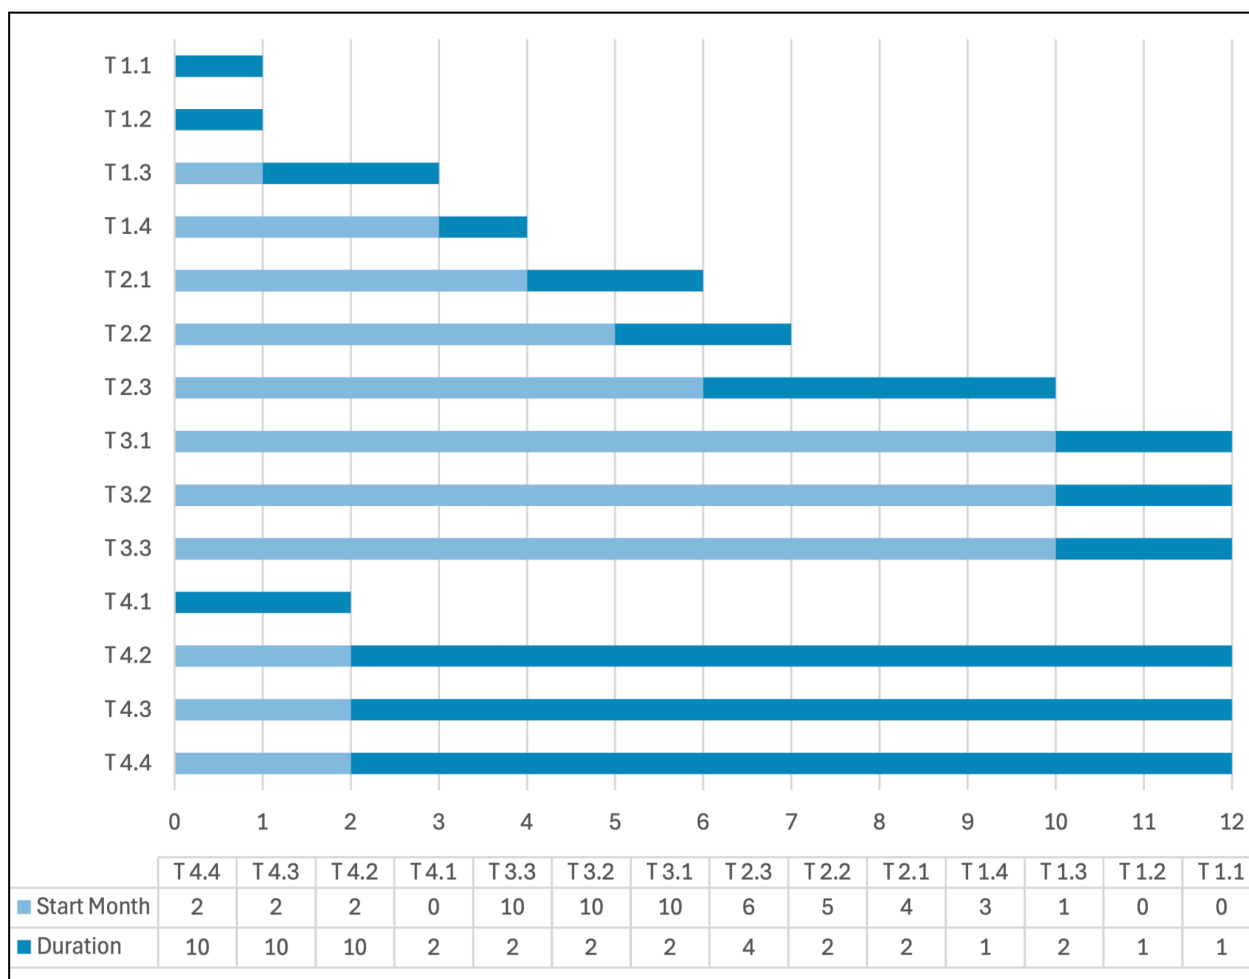

- Списък на резултатите (deliverables) от отделните задачи

Таблица 3: Резултати на проекта

Резултат номер	Заглавие на резултат	Индикативни човеко-месеци	Тип	Дата на представяне (месец от проекта)
D1.1	Доклад описващ текущото състояние на пазара	1	Доклад	1
D1.2	Списък със заинтересовани лица	1	Списък	1
D1.3	Списък с основните конкуренти и откритите пропуски в техните решения	1	Списък	1
D1.4	Документ, описващ правните ограничения и норми	1	Доклад	1
D1.5	Първоначален списък с изисквания спрямо нуждите на заинтересованите лица	2	Списък	3
D1.6	Документ, съдържащ функционални и нефункционални изисквания	1	Доклад	4
D2.1	Документ, описващ софтуерната архитектура	2	Доклад	6
D2.2	Прототипен интерфейс	2	Прототип	7
D2.3	Валидирано софтуерно решение	4	Софтуер	10
D3.1	Рекламни постове в социални мрежи	2	Реклама	12
D3.2	Рекламни постери и билборд реклами	2	Реклама	12
D3.3	Условия и договори с потенциални съдружници	2	Протокол	12
D4.1	Гант диаграма за разпределение на работата	2	Диаграма	2
D4.2	Документ, описващ разпределението на човешки ресурси	2	Доклад	2
D4.3	Анализ на прогреса по зададените задачи	10	Доклад	12
D4.4	Доклади и статистики за финансите	10	Доклад	12
D4.5	Документ, описващ потенциалните рискове	10	Доклад	12
D4.6	Протокол за запазване на интегритета на проекта при загуба на ключов екипен член и обучение на заместник	10	Протокол	12

2.3. Разпределение на ресурсите на проекта по задачи

- **РП1: Анализ и изисквания**

Включва значителни разходи за труд, тъй като е необходимо екип от анализатори и юристи да извърши проучвания на пазара, конкурентни решения и правни изисквания. За тази цел са предвидени около 40,000 лв. за труда на специалистите- 60 лв/час за анализатори и 100 лв/час за юрисконсулт. Това се равнява на 466 работни човекочаса за първите и 100 за вторите. Организацията на срещи със заинтересовани страни и публикуването на анкети изискват около 4,000 лв. за транспорт, наем на помещения, обучения и други консумативи.

- **РП2: Разработка на системата**

Това е най-скъпият етап, тъй като включва проектиране на софтуерна архитектура, дизайн на интерфейса и разработка. За труд са предвидени 100,000 лв., които обхващат работата на софтуерни архитекти, програмисти, дизайнери и тестери. Техният труд е предвиден на 70 лв/час за архитекти, 60 за разработчици и 50 за QA, за да сме конкурентоспособни от към гледна точка на парично възнаграждение и да имаме качествена работна ръка. Това общо са около 1600 човекочаса работа за разработката на софтуера. 5,000 лв. са отделени за тестове и облачни услуги.

- **РП3: Маркетинг**

Изисква около 30,000 лв. за труд, като маркетинг експерти, чийто почасово възнаграждение е оценено за 50 лв, създават рекламни постове и организират срещи с клиники и съдружници. Това са 600 работни човекочаса.Още 1,000 лв. са планирани за транспорт, наем на зали и реклама в социалните мрежи.

- **РП4: Управление на проекта**

Има основен фокус върху координацията и мониторинга на всички етапи. За труд са предвидени 60,000 лв., които покриват работата на проектен мениджър (70 лв/час и 642 човекочаса за целия проект) и екипа по управление на човешките ресурси и качеството(приблизително 45-50 лв/час и 330 човекочаса за целия проект). Отделени са 1,000 лв. за логистични разходи, включително срещи и кетъринг.

Таблица 4. Финансови ресурси

Работен пакет номер	вид разходи						общо (директни + индиректни)
	А: труд (персонал)	Б: материални (техника) и нематериални (софтуер) активи	В: други (пътни, зали, кетъринг, консумативи, хостинг такси...)	Г: подизпълнители	общо директни (А+Б+В+Г)	индиректни (режийни) (А+Б+В)*10%	
1	38,000 лв.	0 лв.	4,000 лв.	0 лв.	42,000 лв.	4,200 лв.	46,200 лв.
2	100,000 лв.	0 лв.	1,000 лв.	0 лв.	101,000 лв.	1,010 лв.	102,010 лв.
3	30,000 лв.	0 лв.	2,000 лв.	0 лв.	32,000 лв.	3,200 лв.	35,200 лв.
4	60,000 лв.	0 лв.	1,000 лв.	0 лв.	61,000 лв.	6,100 лв.	67,100 лв.
Общо	228,000 лв.	0 лв.	8,000 лв.	0 лв.	236,000 лв.	2,360 лв.	250,510 лв.

3. План за разпространение на резултатите (Комуникационна стратегия)

- **Цел на Комуникационна стратегия**

Основната цел на комуникационната стратегия е да популяризира платформата MedAppoint, да информира потенциалните потребители за нейните предимства и функционалности, и да привлече ключови съдружници, които да спомогнат за устойчивото ѝ внедряване и развитие.

- **Описание на целевите групи – до кого трябва да разпространяват резултатите**
Целевите групи включват:

- **Пациенти:**

Крайни потребители, които ще използват платформата за записване на часове, съхранение на медицински данни и достъп до специализирана медицинска помощ.

- **Лекари и медицински заведения:**

Специалисти и клиники, които ще използват системата за управление на графици и обмен на медицинска информация.

- **Държавни институции:**

Организации, които могат да подпомогнат внедряването на платформата на национално ниво.

- **Застрахователни компании:**

Съдружници, които могат да интегрират платформата в своите услуги за здравно осигуряване.

- **Доставчици на медицински софтуер:**

Фирми, които могат да добавят стойност чрез допълнителни функционалности.

- **Обществени здравни организации:**

За по-добро управление на здравната информация.

- **Дейности и средства за разпространение на резултатите от проекта сред целевите групи**

- 1. Рекламни кампании в социалните мрежи:**

- 1.1. Цел: Осведомяване и привличане на крайни потребители.

- 1.2. Метод: Публикации с текст, изображения и видеа за функционалностите на платформата.

- 1.3. Инструменти: Facebook, Instagram.

- 2. Рекламни материали на място:**

- 2.1. Цел: Привличане на вниманието на пациенти и лекари.

- 2.2. Метод: Билбордове и постери в болници, клиники и обществени центрове.

- 3. Директен контакт със съдружници:**

- 3.1. Цел: Сключване на договори с медицински заведения, застрахователи и държавни институции.

3.2. Метод: Провеждане на срещи и демонстрации на платформата.

4. Участие в конференции и семинари:

4.1. Цел: Изграждане на доверие и споделяне на успехите на проекта.

4.2. Метод: Презентации на ползи и възможности за сътрудничество.

5. Анкети и обратна връзка:

5.1. Цел: Събиране на информация за подобрения.

5.2. Метод: Онлайн и офлайн анкети сред потребители.

▪ **Методология на изпълнение:**

Изпълнението ще се базира на добре структурирани маркетингови активности, с планиране на кампанията по време и цели. Контролът ще включва редовни анализи на постигнатите резултати и тяхното съгласуване с общите цели на проекта.

4. Управление на проекта

▪ Екип и структура за управление на проекта

Проектът се управлява чрез йерархична структура със следните ключови роли:

▪ **Проектен мениджър:**

Това е най-висшата позиция в управлението на проекта. Той координира работата на всички екипи и следи за спазване на срокове, бюджет и цели. Той е този, който отговаря за вземането на ключови решения.

▪ **Продуктов мениджър:**

Той докладва на проектния мениджър, определя визията на продукта и приоритизира разработването на функционалности. Продуктовият мениджър работи тясно с маркетинговия екип и екипа по разработка.

▪ **Финансов мениджър:**

Той е отговорен за управлението на бюджета на проекта и следи за оптималното разпределение на ресурсите, контролира разходите и осигурява финансова устойчивост. Финансовият мениджър докладва на проектния мениджър и осигурява финансова отчетност пред вътрешните и външните заинтересовани страни.

▪ **Юрист:**

Той предоставя правни консултации и гарантира, че проектът спазва всички закони и регулации. Това включва изготвянето и преглеждането на договори, проверка за съответствие с нормативните изисквания и управление на правните рискове. Юристът докладва на проектния мениджър и работи в тясно сътрудничество с екипа по разработка и експертите по здравеопазване.

▪ **Експерти по здравеопазването:**

Те докладват на проектния и на продуктивия мениджър. Работят с техническите екипи, за да предоставят експертни насоки относно медицинската достоверност и потребителския опит.

▪ **Специалисти по пазарни и конкуренти проучвания:**

Докладват на продуктивия мениджър и работят с техническите екипи и маркетинговия екип, за да анализират и интегрират събраните данни за пазара и конкурентите.

▪ **Технически екипи:**

Това са: UI/UX дизайнери, които отговарят за потребителския интерфейс и дизайн и докладват на продуктивия мениджър; софтуерни инженери, които разработват системата според изискванията и осигуряват техническата ѝ поддръжка и са под ръководството на проектния мениджър и продуктивия мениджър; QA инженери, които провеждат тестове и осигуряват качеството на продукта, и работят в координация със софтуерните инженери.

- **Маркетинг екип:**
Маркетинг екипът анализира пазара, събира обратна връзка и популяризира продукта. Той работи под ръководството на проектния мениджър.
- **Разпределение на отговорностите и ролите**
 - **Проектен мениджър:**
Осигурява координация и отчетност между екипите.
 - **Продуктов мениджър:**
Определя стратегията и адаптира продукта спрямо нуждите на пазара.
 - **Финансов мениджър:**
Отговаря за бюджета, планирането на разходите и финансовата отчетност. Осигурява, че проектът е икономически устойчив.
 - **Юрист:**
Гарантира правна съвместимост и се грижи за защитата на личните данни и интелектуалната собственост.
 - **Експерти по здравеопазването:**
Осигуряват медицинска информация спрямо съдържанието на проекта.
 - **Специалисти по пазарни и конкуренти проучвания:**
Изследват пазара и конкуренцията, събират данни от потребители.
 - **UI/UX дизайнери:**
Създават интуитивен интерфейс.
 - **Софтуерни инженери:**
Разработват и тестват функционалностите.
 - **QA инженери:**
Провеждат тестове и гарантират качеството.
 - **Маркетинг екип:**
Осигуряват комуникация с потребителите и популяризиране.
- **Основни управленски дейности (описание и начин на работа)**
Основните дейности за управление са следните:
 - **Управление на работа:**
Разделяне на проекта на работни пакети с ясно дефинирани задачи и цели. Създаване на структура за отчетност и разпределение на отговорностите между екипите. Използване на софтуерни инструменти за управление на задачите (напр. Jira, Trello).

- **Управление на време:**

Изготвяне на график с ключови етапи и срокове за изпълнение на задачите. Установяване на зависимости между задачите за оптимално разпределение на времето. Редовно проследяване на прогреса и идентифициране на отклонения от плана.

- **Управление на финанси:**

Определяне и одобрение на бюджета на проекта. Разработване на финансови планове и контролиране на разходите. Осигуряване на отчетност чрез регулярни финансови доклади.

- **Управление на риск:**

Идентифициране на потенциални рискове и анализ на въздействието им върху проекта. Създаване на план за управление на рисковете, включващ превантивни и корективни мерки. Редовно преразглеждане на рисковете и актуализация на плана.

- **Управление на качество:**

Определяне на критерии за качество на продукта и процесите. Провеждане на тестове и ревизии за оценка на качеството. Гарантиране на съответствие със стандартите и очакванията на потребителите.

Главните точки, които трябва да се следят и контролират в проекта са:

- **Работа:**

Напредък по изпълнението на задачите във всеки работен пакет. Ефективност на разпределението на задачите между екипите.

- **Време:**

Съответствие със зададените срокове за изпълнение на задачите. Навременност на доставяне на ключови етапи (milestones).

- **Финанси:**

Реални разходи спрямо одобрения бюджет. Наличие на достатъчно ресурси за покриване на непредвидени разходи.

- **Риск:**

Идентифициране на нови рискове по време на изпълнението на проекта. Ефективност на приложените превантивни и корективни мерки.

- **Качество:**

Съответствие на продукта с определените критерии за качество. Резултати от тестове и проверки на функционалностите.

Методите за управление и контрол на дейностите са:

- **Хибриден подход:**

Agile за итеративна разработка и редовна обратна връзка, заедно с водопаден

модел за подробен анализ и документация. Тази комбинация осигурява гъвкавост и контрол върху сроковете и бюджета.

- **Инструменти:**

Включват се различни системи за управление и комуникация: системи за управление на задачи (например Jira, Trello); инструменти за комуникация (Slack, Microsoft Teams); софтуер за мониторинг на напредъка (например Asana).

Процесът на вземане на решения се съгласува със следните неща:

- Основните решения се вземат от проектния мениджър и продуктивия мениджър с консултация от екипите.
- Използва се квалифицирано гласуване при необходимост, като мнозинството определя резултата.
- Регулярна оценка на прогреса с възможност за адаптация на плана спрямо променящите се условия.

5. Описание на проектния екип и съответното звено – бенефициент

- **Организацията, която ще изпълнява проекта**

Проектът MedAppoint се изпълнява от звено, съставено от експерти в областта на информационните технологии, здравеопазването и проектния мениджмънт.

Организацията разполага с опитни кадри, които притежават техническа компетентност, умения за проучване на пазара и комуникация с ключови заинтересовани страни. Екипът има опит в разработката и внедряването на софтуерни решения, съответстващи на стандартите за сигурност на здравната информация, като съблюдава стриктно международни стандарти като GDPR и HIPAA.

- **Премишен опит:**

Звеното има успешен опит в реализацията на проекти в сферата на дигитализацията на административни и здравни процеси, както и в разработката на интегрирани софтуерни платформи. Управлението на проекти е нещо, в което съответните отговорни лица са практикували в последните години от кариерата си и имат няколко успешно завършени проекта на национално и международно ниво. Вече са изпълнени няколко сходни проекта, които включват:

- Разработка на приложения за онлайн резервации и управление на клиентски данни.
- Интеграция на медицински софтуери и системи за съхранение на чувствителни данни.
- Проучвания на потребителски нужди и внедряване на UX/UI дизайни за подобро потребителско преживяване.

Тази експертиза гарантира успешно планиране, изпълнение и внедряване на проекта, съобразено с изискванията за ефективност и сигурност.

- **Екип за реализиране на проекта**

Проектният екип включва специалисти с конкретни роли и отговорности:

- **Проектен мениджър:**

Отговаря за планирането, координацията и успешното изпълнение на проекта. Управлява екипите и ресурсите.

- **Продуктов мениджър:**

Дефинира визията на продукта и следи за постигането на целите спрямо изискванията на потребителите.

- **Финансов мениджър:**

Контролират финансовите ресурси и изготвят регулярни отчети за разходите.

- **Юрист:**

Отговаря за правната съвместимост на проекта, включително спазването на законодателството, преглежда и изготвя договори и консултира екипа относно спазването на регулаторни изисквания.

- **Експерти по здравеопазване:**
Осигуряват медицински консултации и валидация на функционалностите на платформата.
- **Софтуерни инженери:**
Разработват бекенд и фронтенд компонентите на платформата.
- **UI/UX дизайнери:**
Разработват интуитивен и достъпен интерфейс за потребителите.
- **QA инженери:**
Тестват функционалностите и осигуряват качеството на продукта.
- **Маркетинг екип:**
Отговарят за разпространението на платформата и комуникационната стратегия.
